

gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek – Trias Opolski”

Zaawansowanie robót szacuje się na poziomie 50%. Naszym zdaniem opóźnienie w realizacji wynosi około 3 miesiące. Zagrożony jest termin ukończenia zadania, który zgodnie z umową upływa w listopadzie 2013 r. W tej miejscowości występuje wiele przypadków, w których mieszkańcy nie zgadzają się na budowę sieci w uzgodnionych wcześniej lokalizacjach, co również może mieć wpływ na

wać koniecznością zwrotu części dotacji unijnej.

Kontrakt VI

- „Budowa solarnej suszarni osadów na oczyszczalni ścieków w Antoniowie”.

Wybrany w drodze przetargu Wykonawca zadania w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, Firma METROMEX z Olsztyna, ogłosił upadłość. Po 3-miesięcznym okresie niepewności syndyk masy upadłościowej zdecydował się na realiza-

Kontrakt VII
- „Przebudowa i modernizacja SUW w Ozimku, Mnichusie i Biestrzynniku oraz budowa centralnej dyspozytorni w Antoniowie”.

Modernizacje Stacji Uzdatniania Wody w Mnichusie, Biestrzynniku oraz Ozimku przy ulicy Polnej zostały zakończone. Trwa modernizacja SUW w Ozimku przy ulicy Częstochowskiej. Umowny termin zakończenia 31.03.2013 r. z uwagi na

się na poziomie około 82%, zaawansowanie finansowe na około 77%. Termin zakończenia projektu upływa 31.12.2013 r. a termin uzyskania efektu ekologicznego – 31.12.2014 r.

Ponadto PGKiM Sp. z o.o. złożyło wniosek o rozszerzenie projektu o budowę sieci kanalizacyjnej w Krzyżowej Dolinie, gdyż pojawiła się możliwość niewielkiego rozszerzenia zadania w oparciu o środki z rezerwy. Decyzja w tej sprawie będzie podjęta przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w I kw. 2013 r.


Niezależnie od opisanego wyżej projektu nazywanego przez nas w skrócie „TRIAS-em”, nasza Spółka wystąpiła i uzyskała pozytywną decyzję o dofinansowaniu budowy kanalizacji w Chobiu (bez przysiółka Kuziory), ze środków tzw. PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Wykonawca wszedł tam już na budowę, która winna być zakończona do 30 listopada 2013 r.

W podsumowaniu przedstawionej wyżej informacji pragniemy dodać, że realizacja tej największej jak dotychczas w Gminie Ozimek inwestycji niesie za sobą zwiększone koszty eksploatacyjne, co wiąże się ze wzrostem opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków. Obowiązuje tu bowiem zasada „zanieczyszczający płaci”. Wszystkie związane z powstaniem nowego majątku dodatkowe koszty dostawy wody (te występują w znacznie mniejszej skali) i odprowadzania i oczyszczania ścieków, muszą się znaleźć w taryfach.

Opracowali:

A.Bator, K.Durkalec, J.Fujak

Dokumentacja postępu robót - str. 8.

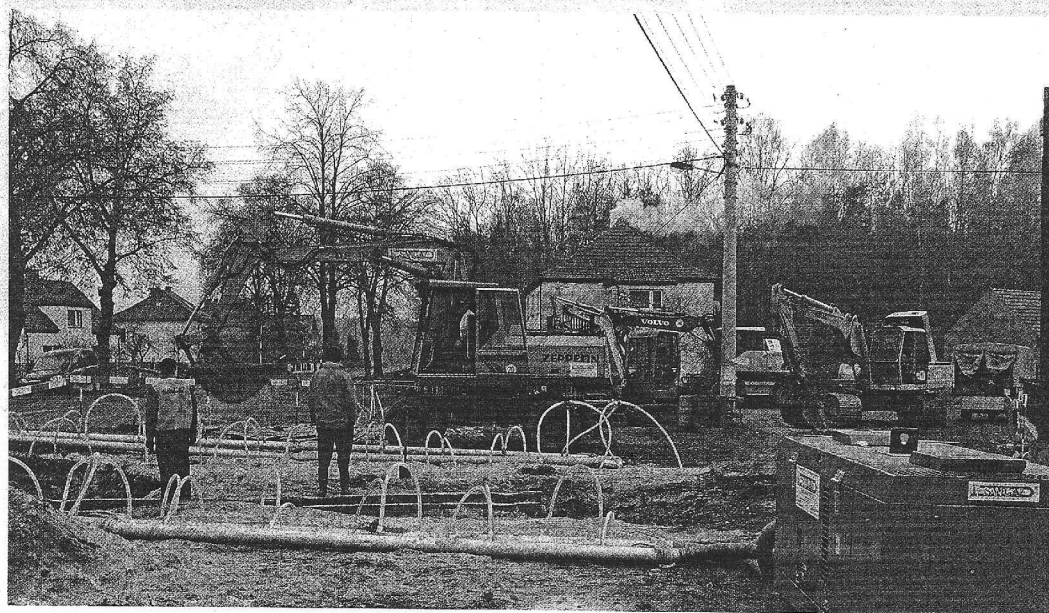

termin i koszty realizacji zadania.

Kontrakt V

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozimek i Nowa Schodnia”.

Realizacja kontraktu została zakończona wiosną br., wartość kontraktu zgodnie z Końcowym Świadectwem Płatności wyniosła 5.475.780 zł i była bardzo zbliżona do wartości umownej, która wynosiła 5.458.197 zł. Do sieci kanalizacyjnej podłączono 117 posesji. Nie podłączono 25 posesji – co stanowi 17 %.

Po tym oddanym najwcześniej do eksploatacji projekcie kanalizacyjnym widać zagrożenie w osiągnięciu efektu ekologicznego (podłączenie do kanalizacji 6.650 osób) co może skutko-

wać zadania, w większości przez podwykonawców.

Dotychczas opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Na początku grudnia Wykonawca wszedł na budowę. Do końca grudnia zdążył usunąć drzewa i przełożyć kable 15 kV oraz wylać chudy beton pod ławy fundamentowe. Termin zakończenia zadania, który upływa we wrześniu 2013 r. jednak z powodów opisanych wyżej jest zagrożony.

Jest jedynym z kontraktów, którego wartość po przetargu (5.928.600 zł) jest wyższa niż w kosztorysie inwestorskim (5.575.462 zł).

trudne, zimowe warunki atmosferyczne jest zagrożony.

Kontrakt VIII

- „Poprawa zaopatrzenia w wodę”. Budowa pompowni II stopnia i sieci wodociągowej w Ozimku oraz przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa zbiornika dolnego w Szczedrzyku”.

Kontrakt najmniejszy i zakończony najwcześniej. Wartość kontraktu zgodnie z Końcowym Świadectwem Płatności wyniosła 1.508.936 zł i była bardzo bliska wartości umownej wynoszącej 1.531.108 zł.

Zaawansowanie rzeczowe całego projektu szacuje

