

## Jak powstaje kanalizacja? (17)


# Koniec Trias-u coraz bliżej....

**Wielkimi krokami zbliżamy się do ukończenia pierwotnych założeń Projektu „Poprawa Jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski”.**

W miejscowościach uprzednio objętych zadaniami budowy kanalizacji sanitarnej w których zakończono prace montażowe, trwają intensywne roboty budowlane (wykonywane bezpośrednio przez ekipy PGKiM Sp. z o.o. lub samych zainteresowanych) związane z podłączeniami poszczególnych posesji do sieci kanalizacyjnej. Prace podłączeniowe trwają aktualnie w Krasiejowie, Biestrzynie, Dylakach i Szczedrzyku. Najmniejsze zainteresowanie podłączeniem prywatnych posesji do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej zauważamy w miejscowościach Biestrzyna i Dylaki. Największe zainteresowanie podłączeniem swoich budynków do sieci wykazują mieszkańcy Szczedrzyka (na dzień 04.09.2013 - 270 podłączonych posesji). Jako, że warunkiem, jaki należało spełnić, aby otrzymać wsparcie z funduszy UE, było docelowe podłączenie do sieci docelowo 7.188 osób w całej Gminie, bardzo istotne jest zaangażowanie jej mieszkańców w jak najszybsze podłączenie się do nowej sieci kanalizacyjnej. Niespełnienie tego warunku stwarza ryzyko zwrotu przez PGKiM części otrzymanej dotacji unijnej.

**Ostatni z kontraktów tj.: Kontrakt IV - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec** objęty w/w Projektem, również zbliża się ku końcowi, pomimo że w związku z licznymi zmianami projektowymi poprzedni termin zakończenia robót wydłużony został o 1 miesiąc, tj. do 09.09.2013 r. Zakończono prace związane z przeglądem sieci oraz rozruchem technologicznym poszczególnych przepompowni ścieków. Następnym etapem będzie przygotowanie dokumentacji do wystąpienia z wnioskiem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na użytkowanie sieci. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń będzie można przystąpić do prac przyłączeniowych poszczególnych posesji. Pierwsze podłączenia mogą nastąpić jeszcze jesienią br., pozostałe od wiosny 2014 r.

**Zakończyły się również prace związane z budową suszarni osadów pościekowych w Antoniowie.** Po dokonaniu niezbędnych prób

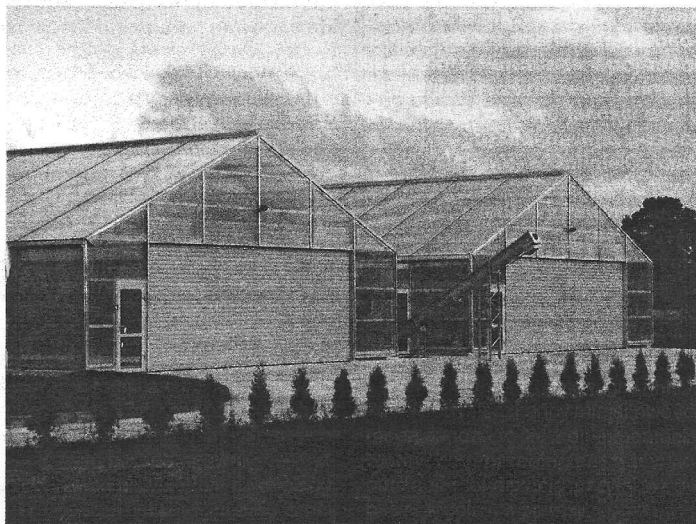

rozruchowych PGKiM Sp. z o.o. rozpoczęła jej eksploatację i już od połowy sierpnia br osady, które niejednokrotnie uprzykrzały życie okolicznym mieszkańcom zostają poddane termicznej obróbce w solarnej suszarni osadów. Aktualnie trwają rozmowy z potencjalnymi odbiorcami zajmującymi się utylizacją powstałego suszu poprzez jego spalanie.

**Wykonawca budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chobie również zbliża się do finiszu. Zadanie to realizowane jest przy wsparciu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.** Firma KURPET z Ligoty Dolnej, zakończyła budowę głównych kolektorów grawitacyjnych i odcinków kanalizacji tłocznej wraz z przyłączami. Do wykonania pozostało posadowienie i wyposażenie trzech sieciowych przepompowni ścieków. Wykonawca przystępuje również do wykonywania odtworzeń nawierzchni drogowych, które zostały rozebrane na okres prowadzenia prac. Prace odtworzeniowe zaczną się od ulicy Leśnej i sukcesywnie przesuwają się będą ulica Wiejską od nr 1 w kierunku centrum miejscowości i dalej do ul. Wrzosowej. Po wbudowaniu i wyposażeniu przepompowni rozpoczną się przeglądy techniczne i próby rozruchowe. Termin zakończenia zadania zgodnie z umową upływa 30.10.2013 r.

Ten sam wykonawca, który wykonał w Chobiu wygrał przetarg na budowę kanalizacji w Krzyżowej Dolinie. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyżowa Dolina objęta została dofinansowaniem z Funduszu Spójności w ramach rozszerzenia zakresu Projektu „Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski”.** Termin zakończenia prac, zgodnie z zawartą umową upływa z końcem maja 2014r. Firma KURPET rozpoczęła roboty od ul. Poprzecznej i Spórackiej, w dalszej kolejności będzie prowadzić roboty w ul. Polnej. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizował w budynku Świetlicy wiejskiej, gdzie w godzinach 700-1600 mieszkańcy miejscowości mogą zapoznać się z dokumentacją techniczną, przebiegiem trasy kanalizacji i lokalizacją przyłączy do poszczególnych posesji.

Zaawansowanie rzeczowe całego projektu szacuje się na poziomie około 92%, zaawansowanie finansowe na około 85%. Termin zakończenia projektu, w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzyżowa Dolina został przedłużony do 30.09.2014 r.

*Aleksandra Bator  
Krzysztof Durkalec*



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

